




# T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

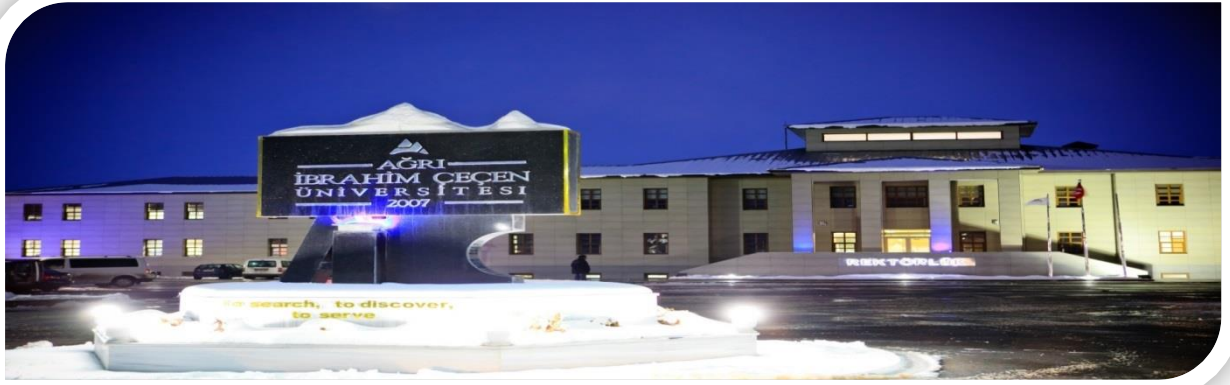

*2016 Yılı*

*Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu*

*“Doğudan Yükselen Işık”*

## İçindekiler

1. GENEL DEĞERLENDİRME .....	1
1.1 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları .....	1
1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi: .....	1
1.3 2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı: .....	7
1.4 2016 Yılı Yatırım Uygulamaları .....	9
Genel Yatırım Uygulama Durumu: .....	9
Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar: .....	9
2. 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI .....	10
2.1 Devam Eden Projeler: .....	11
2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri .....	11
1-Derslik ve Merkezi Birimler (DAP) .....	11
2-Lojman ve Sosyal Tesis (DAP) .....	16
3-Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP) .....	17
4-Kampüs Altyapısı (DAP).....	19
2.2 Tamamlanan Projeler .....	21
2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi: .....	21
2.2.2 Proje Tamamlama Raporu.....	21
3. Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler:.....	24
EKLER .....	25

## Yönetici Özeti

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesinde kamu kurum ve kuruluşları; Kamu yatırım projelerinin gerçekleştirme ve uygulama sonuçlarını her yıl düzenleyecekleri bir raporla değerlendirebilirler hükmüne yer verilmiştir. Buna istinaden Üniversitemiz 2016 yılı yatırımlarını 11.641 öğrenci ve 581 Akademik ve İdari Personelin, “Beslenme, barınma, sağlık, kültür



ve spor, eğitim ve genel kamu hizmetleri gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaçla; Kütüphane, derslikler, amfiler, konferans salonları, öğrenci kantinleri, toplantı salonları, kapalı ve açık spor salonları tesis edilmesi için fizibilite, proje, ihale ve iş bitimine kadar tüm işlemleri” eldeki kıt kaynaklarla etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek amacıyla mesai sarf etmektedir.

Bu doğrultuda üniversitemiz bir yandan gerek altyapı gerekse bina, derslik, spor tesisi gibi fiziksel alanlar üretmeye çalışırken diğer yandan üreten, araştıran ve sorgulayan, bilimsel düşünme gücüne sahip, yapıcı, yaratıcı ve üretken, spora, sanata değer veren, mesleğinde en iyisi olan ve aranılan gençler yetiştirmek, yaptığı bilimsel araştırma projeleriyle çağdaş bilime hizmet etmeyi hedeflemektedir.

Bu kapsamda harcamalarımızda tasarrufu sağlamak ve tutarlı, dengeli, etkili, stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun bir bütçe politikası izleyerek yatırım projelerimizi gerçekleştirmekteyiz.

**Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT**  
**Rektör**

## 1. GENEL DEĞERLENDİRME

### 1.1 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun'da II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup Özel Bütçeli bir kurumdur.

#### Gelirlerimiz ise:

Özel Bütçe

Hazine Yardımı

Öz Gelirler

- \* Kira Gelirleri
- \* SKS (Sosyal Tesis, Anaokulu, Lojman, Kantin Ve Kafeterya vs.) Gelirleri
- \* Örgün ve Yaygın Öğretim Gelirleri
- \* İkinci Öğretim Gelirleri
- \* Diğer Hizmet Gelirleri

### 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi:

Üniversitemiz 7 Fakülte, 3 Enstitü, 6 Yüksekokul ve 6 Meslek Yüksekokulu ile hizmet vermektedir. Üniversitemizin hizmet sunduğu alanlar ve kapasiteleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

#### *Hizmet Alanları ve Kapasiteleri*

Derslik ve Laboratuvarlar						
Eğitim Alanı	Kapasite 0-50	Kapasite 51-75	Kapasite 76-100	Kapasite 101-150	Kapasite 151-250	Kapasite 251+
Amfi	6	4	4	6	2	-
Sınıf	194	75	32	8	-	-
Bilgisayar Laboratuvarları	22	5	5	3	-	-
Diğer Laboratuvarlar	21	35	7	12	4	-
<b>Toplam</b>	<b>243</b>	<b>119</b>	<b>48</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	<b>-</b>

Toplantı ve Konferans Salonu Sayıları						
	Kapasitesi					
	0-50	51-75	76-100	101-150	151-250	251+
Toplantı Salonu	8	7	-	-	-	-
Seminer Salonu	4	3	2	1	-	-
Konferans Salonu	-	-	-	-	1	3
<b>Toplam</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

*2015-2016 Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları*

Öğrenci Sayıları									
Birim Adı	I. Öğretim			II. Öğretim			Toplam		Genel Toplam
	E	K	Top.	E	K	Top.	Erkek	Kız	
Fakülteler	2611	2498	5109	632	544	1176	3226	3059	6285
Yüksekokullar	471	288	759	164	87	251	635	375	1010
Enstitüler	493	226	719	-	-	-	493	226	719
Meslek Yüksekokulları	1066	908	1974	754	459	1213	1820	1367	3187
Formasyon	225	215	440	-	-	-	225	215	440
<b>TOPLAM</b>	<b>4.866</b>	<b>4.135</b>	<b>9.001</b>	<b>1.550</b>	<b>1.090</b>	<b>2.738</b>	<b>6.399</b>	<b>5.242</b>	<b>11.641</b>

*Kaynak:* AİÇÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (31.12.2016 itibariyle)

## Kapalı Alanlar

1-MERKEZ KAMPÜS			
	Binanın Adı	Tamamlanma Oranı (%)	Kapalı Alan(m2)
1	Rektörlük Binası (A-B-C Blokları 5400+3153)	100	8.553
2	Eğitim Fakültesi (A-B-C-D-E-F BLOKLARI) 7890+14960	100	22.850
3	Fen-Edebiyat Fakültesi	100	7.500
4	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	100	5.400
5	Eczacılık Fakültesi	100	6.130
6	Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu	100	6.130
7	İslami İlimler Fakültesi	100	7.400
8	Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı	100	3.200
9	Kültür ve Kongre Merkezi	100	16.200
10	Garaj ve Atölye	100	6.850
11	Merkezi Yemekhane-Kafeterya	100	6.060
12	Kapalı Spor Salonu (Yeni )	100	6.500
13	Stadyum	100	18.000
14	Sosyal Tesis (Misafirhane)	100	3.450
15	Isı Merkezi	100	650
16	Rektör Konutu	100	491
17	Lojman (100 Adet)	100	12.000
18	Üniversite Camisi	100	3.750
19	Meslek Yüksek Okulu	100	7.400
20	Enstitüler (Fen B. Sosyal B. Sağlık B.)	100	3.900
21	Yarı Olimpik Yüzme Havuzu	100	6.000
<b>TOPLAM</b>			<b>151.014</b>

## Kapalı Alanlar

2-SAĞLIK KAMPÜSÜ			
	Binanın Adı	Tamamlanma Oranı (%)	Kapalı Alan(m2)
1	Sağlık Yüksekokulu	100	
2	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	100	
3	Sürekli Eğitim Merkezi	100	12.905
4	Spor Salonu	100	
5	Lojman 24 Adet	100	
<b>TOPLAM</b>			<b>12.905</b>

## Kapalı Alanlar

3-PATNOS KAMPÜSÜ			
	Binanın Adı	Tamamlanma Oranı (%)	Kapalı Alan(m2)
1	Patnos Sultan Alparslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakülte Dekanlık Binası	100	2.100
2	Patnos Sultan Alparslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakülte Derslik Binası	100	8.100
3	Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu	0	0
4	Patnos Meslek Yüksekokulu	0	0
<b>TOPLAM</b>			<b>10.200</b>

*Kapalı Alanlar*

4-DOĞUBEYAZIT KAMPÜSÜ			
	Binanın Adı	Tamamlanma Oranı (%)	Kapalı Alan(m2)
1	Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokul Binası	100	8.071
2	İdari Bina	100	1.000
3	Yemekhane Binası	100	997
4	Spor Salonu	100	1.472
5	Lojman	100	1.500
6	Konferans Salonu-Anfi	100	1.200
<b>TOPLAM</b>			<b>14.240</b>

*Kapalı Alanlar*

5-ELEŞKİRT KAMPÜSÜ			
	Binanın Adı	Tamamlanma Oranı (%)	Kapalı Alan(m2)
1	Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu	100	7.000
2	Eleşkirt Meslek Yüksekokulu	0	0
<b>TOPLAM</b>			<b>7.000</b>

*Kapalı Alanlar*

6-TAŞLIÇAY KAMPÜSÜ		
Binanın Adı	Tamamlanma Oranı (%)	Kapalı Alan(m2)
Ağrı Meslek Yüksek Okulu (Taşlıçay Ek Bina)	100	3.000
<b>TOPLAM</b>	100	3.000
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>201.359</b>

**Kaynak:** AİÇÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (21.06.2016 itibariyle)

*Açık Alanlar*

YERLEŞKE	Tapulu Arsa ( m2 )
Merkez Kampüs	1.720.000
Eski Eğitim Kampüsü	171.700
Patnos Yerleşkesi	101.600
Doğubayazıt Yerleşkesi	63.000
Eleşkirt Yerleşkesi	272.000
<b>TOPLAM</b>	<b>2.328.300</b>

**Kaynak:** AİÇÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (31.12.2016 itibariyle)

**Tablo 1. Üniversitemiz Taşınmazlarının Mülkiyet Durumuna Göre Dağılımı**

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m2)			Toplam (m2)
	Üniversite	Hazine	Diğer	
Merkez Kampüs	17.383,731	1.522.393,21	-	1.539.776,94
Patnos	-	50.000,00	39.606,00	89.606,00
Doğubayazıt	-	59.768,00	-	59.768,00
Eleşkirt	172.982,00	475.335,45	-	648.317,45
Sağlık Kampüsü	-	171.000,00	-	171.000,00
<b>Toplam</b>				<b>2.337.468,39</b>

**Tablo 2. Kapalı Alanların Kullanım amacına Göre Dağılımı**

Yerleşke Aid	Hizmet Alanı (m <sup>2</sup> )								Toplam Hizmet Alanı
	Eğitim	Sağlık	Barınma	Beslenme	Kültür	Spor	Bil. Tek. Arş.	Diğer	
Merkez Kampüs	64.399	0	4.636	6.060	16.200	12.874	1.456	9.560	115.185
Eleşkirt Kampüsü	8.011	0	0	229	0	0	140	3.157	11.537
Doğubayazıt Kampüsü	2.056	0	120	504	0	1.224	220	6.647	10.771
Sağlık Kampüsü	3.972	0	0	0	0	928	0	0	4.900
Patnos Kampüsü	1.606	0	0	0	0	0	45	4.317	5.968
<b>Toplam</b>									<b>148.361</b>



Tablo 3. Spor Amaçlı Bina ve Tesisler

Bina ve Tesisin Adı	Bulunduğu Yerleşke	Adet	Açık Spor Alanları	Kapalı Spor Alanları	Toplam Alan (m <sup>2</sup> )
Çok Amaçlı Spor Salonu	Merkez Kampüs	1	0	6874	6.874
Tenis Kortları ve Halı Saha	Merkez Kampüs	1	1.060	0	1.060
Stadyum	Merkez Kampüs	1	17.204	0	17.204
Yarı olimpik Yüzme Havuzu	Merkez Kampüs	1	0	6000	6.000
Kapalı Spor Salonu	Sağlık Kampüsü	1	-	1224	1.224
Kapalı Spor Salonu	Doğubayazıt Kampüsü	1	-	928	928
<b>Toplam</b>		<b>6</b>	<b>18.264</b>	<b>15.026</b>	<b>33.290</b>

Tablo 4. Arazi Alanları

Arazinin Türü	Alan ( m <sup>2</sup> )
Orman	-
Tarım Alanı	-
Bahçe	3.200
Tescil Harici Araziler	25.335
Diğer ( üniversiteye ve hazineye ait olmayan arazi)	26.500
Gölet	3.000
Kampüs Dışı Araziler	380.775
<b>Toplam</b>	<b>438.810</b>

Tablo 5. Yemekhane, Kantin ve Misafirhanelerin Yerleşkelere Dağılım Oranı

Yerleşke	Öğrenci Yemekhanesi	Personel Yemekhanesi	Kantin	Kafeterya	Misafirhane
Merkez Kampüs	1	1	11	1	1 ( 37 Oda )
Sağlık Kampüsü	1 (Ortak)		1		-
Doğubayazıt Kampüsü	1 (Ortak)		1		1 ( 6 Oda )
Eleşkirt Kampüsü	1 (Ortak)		1		-
Taşlıçay Kampüsü	1 (Ortak)		1		-

Tablo 6. Üniversitemiz Lojmanlarının Yerleşkelere Dağılımı

Yerleşke	2+1	3+1	Toplam
Merkez Kampüs	40	60	100
Sağlık Kampüsü	24	-	24
Doğubayazıt Kampüsü	-	12	12
Toplam	64	72	136

Tabloda da görüldüğü gibi üniversitemizin toplam 136 adet lojmanı bulunmaktadır. Merkez kampüsteki 100 adet lojmanda ayrıca iki adet bodrum katı bulunmakta olup şu anda idari personellerimiz tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca Ağrı merkezde personellerimizin kullanımı için kiralanmış 40 adet lojman dairesi bulunmaktadır.

### 1.3 2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı:

- Merkezi kampüste yer alan Kültür Merkezi ve Kütüphane Bilgi İşlem Merkezi, Meslek Yüksekokulu Binası, Enstitü ve Araştırma Merkezi ve Fitness Merkezi ve Güneş Enerji Sistemli, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Binalarının inşaatı tamamlanmıştır.
- Merkezi Kampüs içerisinde yer alan 5 Km'lik ana yollar asfaltlanmıştır.
- Patnos kampüsünde yer alan Patnos Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi inşaatı tamamlanmıştır.
- Merkez kampüs içerisinde 100 adet lojman yapımı ihalesi tamamlanmış olup 2017 yılı içerisinde inşaata başlanıp 2018 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
- Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının tadilat işleri yapılmıştır.
- Muhtelif İşler Projesi kapsamında üniversitemiz, ihtiyaçlarını tabloda gösterildiği üzere belirtilen alanlarda harcamalarını gerçekleştirilmiştir.

<b>Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi:</b>	<b>32.798.255,80</b>
<b>İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı</b>	<b>1.634.073,32</b>
Mamul Mal Alımları	1.634.073,32
<b>Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı</b>	<b>258.331,88</b>
Mamul Mal Alımları	258.331,88
<b>Bilgi İşlem Daire Başkanlığı</b>	<b>199.804,26</b>
Mamul Mal Alımları	31.056,62
Gayri Maddi Hak Alımları	168.747,64
<b>Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı</b>	<b>30.706.046,34</b>
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	623.494,21
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	28.630.790,19
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.451.761,94

Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımı					
Ekonomik Kod	Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Yılsonu Ödeneği	Harcama	KBÖ'ye Göre Harcama Oranı
06.1	Mamul Mal Alımları	2.170.000,00	1.939.389,00	1.923.462,00	88,64
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	280.000,00	168.748,00	168.748,00	60,27
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	0,00	623.494,00	623.494,00	
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	20.000.000,00	32.423.457,00	28.630.790,00	143,15
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.660.000,00	1.451.762,00	1.451.762,00	87,46
	<b>Toplam</b>	<b>24.110.000,00</b>	<b>36.606.850,00</b>	<b>32.798.256,00</b>	<b>136,04</b>

### 1.4 2016 Yılı Yatırım Uygulamaları

#### Genel Yatırım Uygulama Durumu:

2016 yatırım programında yer alan Kültür Merkezi ve Kütüphane Bilgi İşlem Merkezi (16.200 m2) , Meslek Yüksekokulu Binası (7.440 m2) ve Patnos Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (7.586 m2), Fitness Merkezi ve Güneş Enerji Sistemli, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu (5.700 m2) ile yıl içerisinde eklenen Enstitü ve Araştırma Merkezi (3.130 m2) binalarının tamamlanması amacıyla 12.497.000,00 TL ödenek eklenmiştir.

Sektör	Projenin Sayısı	2016 Yılı Program Ödeneği	2016 Yılı Revize Ödeneği	2016 Yıl Gerçekleşme	Harcama Revize Ö. Göre %
Eğitim	7	24.110.000	36.607.000	32.792.000	90

#### Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:

Özellikle bölgemizde yaşanan yoğun kış şartları ve inşaat mevsiminin kısa olması sebebiyle yatırım ödeneklerinin inşaat sezonu göz önüne alınarak serbest bırakılması, yıl itibari ile planlanan ve yayımlanan bütçe ödenekleri üzerinde yıl içerisinde bildirimsiz ani kesintilere gidilmesi özellikle yıllık ihalelerde sıkıntılar yaratmaktadır.

Maliye Bakanlığınca yıl sonlarında son üç aylık ödeneklerin bloke tutulması, yapılan programların aksamasına neden olmaktadır.

## 2. 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI

### 2.1. Devam Eden Projeler

Proje No	Sektör	Projenin Adı	Proje Sahibi
2009H030160	Eğitim	Derslik ve Merkezi Birimler	AİÇÜ
2009H030170	Eğitim	Lojman ve Sosyal Tesis	AİÇÜ
2010H050040	Eğitim	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	AİÇÜ
2009H030150	Eğitim	Kampüs Altyapısı	AİÇÜ

### 2.2. Tamamlanan Projeler

Proje No	Sektör	Projenin Adı	Proje Sahibi
2016H031180	Eğitim	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	AİÇÜ
2016H031190	Eğitim	Muhtelif İşler	AİÇÜ
2016H031200	Eğitim	Yayın Alımı	AİÇÜ

## 2.1 Devam Eden Projeler:

### 2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

#### 1-Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)

<b>1) Proje No</b>	2009H030160	<b>7) Toplam Harcama Tutarı (TL)</b>	103.798.740,00
<b>2) Uygulayıcı Kurum</b>	Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi	<b>8) 2016 Yılı Ödeneği (TL)</b>	10.000.000,00
<b>3) Başlama-Bitiş Tarihi</b>	2009-2017	<b>9) 2016 Yılı Revize Ödeneği (TL)</b>	17.528.898,41
<b>4) Uygulama Yeri (İl/İlçe)</b>	Ağrı	<b>10) 2016 Yılı Harcaması (TL)</b>	17.519.285,28
<b>5) Proje Tutarı (TL)</b>	96.000.000,00	<b>11) Projenin Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)</b>	98,00
<b>6) Revize Proje Tutarı (TL)</b>	103.528.898,41	<b>12) Projenin Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)</b>	98,00
<b>2016 Yılı Uygulamaları</b>			
<b>13) Gerçekleştirilen Faaliyetler</b>	2016 yılı yatırım programında; Kültür Merkezi ve Kütüphane Bilgi İşlem Merkezi (16.200 m <sup>2</sup> ), Meslek Yüksekokulu Binası (7.440 m <sup>2</sup> ) ve Patnos Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (7.586 m <sup>2</sup> ) yer almaktadır. Yatırım programına yıl içerisinde Enstitü ve Araştırma Merkezi (3.130 m <sup>2</sup> ) eklenmiştir.		
<b>14) Uygulama Sonuçları</b>	Kültür Merkezi ve Kütüphane Bilgi İşlem Merkezi (Fiziki Gerçekleşme Oranı: %100, Nakdi Gerçekleşme Oranı: %100), Meslek Yüksekokulu Binası (Fiziki Gerçekleşme Oranı: %100, Nakdi Gerçekleşme Oranı: %100), Patnos Mühendislik, Doğa Bilimleri Fakültesi (Fiziki Gerçekleşme Oranı: %100, Nakdi Gerçekleşme Oranı: %100) olup ilgili işlere ait geçici kabul yapılmıştır. Enstitü ve Araştırma Merkezi (Fiziki Gerçekleşme Oranı: %96, Nakdi Gerçekleşme Oranı: %95)		

Kültür Merkezi ve Kütüphane Bilgi İşlem Merkezi:



Kapalı Alan Büyüklüğü	Sözleşme İmzalama Tarihi	Bitiş tarihi	Sözleşme Bedeli ve İş Artışı (TL.) (KDV hariç)	Fiyat Farkı	Harcama-Nominal (TL.)			
					2014	2015	2016	Toplam Harcama
16.200 m2	16.07.2014	05.08.2016	20.508.648,99	769.948,00	5.380.293,43	12.986.856,75	6.424.757,93	24.791.908,11

### Meslek Yüksekokulu Binası



Kapalı Alan Büyüküğü (m2)	Sözleşme İmzalama Tarihi (gg/aa/yy)	Bitiş Tarihi	Sözleşme Bedeli ve İş Artışı (TL.) (KDV hariç)	Fiyat Farkı	Harcama-Nominal (TL.)			
					2014	2015	2016	Toplam Harcama
7.440 m2	30.04.2015	10.08.2016	6.662.373,42	203.288,67	0,00	4.635.736,99	3.456.530,09	8.092.267,08



### Patnos Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi



Kapalı Alan Büyüklüğü (m2)	Sözleşme İmzalamaya Tarihi (gg/aa/yy)	Bitiş Tarihi	Sözleşme Bedeli ve İş Artışı (TL.) (KDV hariç)	Fiyat Farkı	Harcama-Nominal (TL.)			
					2014	2015	2016	Toplam Harcama
7.586 m2	19.11.2014	17.10.2016	8.392.575,49	301.774,40	1.413.546,70	4.695.056,30	4.145.384,87	10.253.987,87

Enstitü ve Araştırma Merkezi



Kapalı Alan Büyüklüğü (m2)	Sözleşme İmzalama Tarihi (gg/aa/yy)	Bitiş Tarihi	Sözleşme Bedeli ve İş Artışı (TL.) (KDV hariç)	Fiyat Farkı	Harcama-Nominal (TL.)			
					2014	2015	2016	Toplam Harcama
3.130 m2	27.06.2016	-	2.594.902,14	40.902,14	0,00	0,00	3.007.853,34	3.007.853,34

## 2-Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)

1) Proje No	2009H030170	7) Toplam Harcama Tutarı (TL)	18.992.959,00
2) Uygulayıcı Kurum	Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi	8) 2016 Yılı Ödeneği (TL)	4.000.000,00
3) Başlama-Bitiş Tarihi	2009-2017	9) 2016 Yılı Revize Ödeneği (TL)	4.000.000,00
4) Uygulama Yeri (İl/İlçe)	Ağrı	10) 2016 Yılı 4. Dönem Harcaması (TL)	216.946,41
5) Proje Tutarı (TL)	30.000.000,00	11) Projenin Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	63,31
6) Revize Proje Tutarı (TL)	30.000.000,00	12) Projenin Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	63,79
<b>2016 Yılı Uygulamaları</b>			
13) Gerçekleştirilen Faaliyetler	Proje kapsamında Lojman (100 daire) yer almaktadır. Projenin ihalesi yapılmıştır.		
14) Uygulama Sonuçları	Gerçekleşme oranı %0'dır		

Lojman (100 daire)

Kapalı Alan Büyüklüğü (m2)	Sözleşme İmzalamaya Tarihi (gg/aa/yy)	Bitiş Tarihi	Sözleşme Bedeli ve İş Artışı (TL.) (KDV hariç)	Fiyat Farkı	Harcama-Nominal (TL.)			
					2014	2015	2016	Toplam Harcama
16.590 m2	02.01.2017	-	9.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 3-Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP)

1) Proje No	2010H050040	7) Toplam Harcama Tutarı (TL)	13.538.945,00
2) Uygulayıcı Kurum	Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi	8) 2016 Yılı Ödeneği (TL)	3.000.000,00
3) Başlama-Bitiş Tarihi	2010-2017	9) 2016 Yılı Revize Ödeneği (TL)	8.519.635,00
4) Uygulama Yeri (İl/İlçe)	Ağrı	10) 2016 Yılı 4. Dönem Harcaması (TL)	8.519.634,99
5) Proje Tutarı (TL)	10.000.000,00	11) Projenin Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	87,24
6) Revize Proje Tutarı (TL)	15.519.635,00	12) Projenin Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100,00
<b>2016 Yılı Uygulamaları</b>			
13) Gerçekleştirilen Faaliyetler	Proje kapsamında Fitness Merkezi ve Güneş Enerji Sistemli, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu (5.700 m2) yer almaktadır.		
14) Uygulama Sonuçları	2015 yılında yapına başlanan Fitness Merkezi ve Güneş Enerji Sistemli Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun Fiziki Gerçekleşme Oranı: %100, Nakdi Gerçekleşme Oranı: %100'dür.		

### Fitness Merkezi ve Güneş Enerji Sistemli, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu

Seyirci Kapasitesi	Alan Büyüklüğü (m2)	Sözleşme İmzalama Tarihi (gg/aa/yy)	Bitiş Tarihi	Sözleşme Bedeli ve İş Artışı (TL.) (KDV hariç)	Fiyat Farkı	Harcama-Nominal (TL.)		
						2015	2016	Toplam
324	5.712 m2	13.11.2015	20.12.2016	8.111.320	143.640,63	347.120,78	8.378.405,41	8.725.526,19



#### 4-Kampüs Altyapısı (DAP)

1) Proje No	2009H030150	7) Toplam Harcama Tutarı (TL)	18.594.389,00
2) Uygulayıcı Kurum	Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi	8) 2016 Yılı Ödeneği (TL)	2.500.000,00
3) Başlama-Bitiş Tarihi	2009-2017	9) 2016 Yılı Revize Ödeneği (TL)	2.297.633,51
4) Uygulama Yeri (İl/İlçe)	Ağrı/Merkez	10) 2016 Yılı 4. Dönem Harcaması (TL)	2.297.633,51
5) Proje Tutarı (TL)	20.000.000,00	11) Projenin Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	92,97
6) Revize Proje Tutarı (TL)	20.000.000,00	12) Projenin Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	93,00
<b>2016 Yılı Uygulamaları</b>			
13) Gerçekleştirilen Faaliyetler	Proje kapsamında Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı ve Telefon Hattı yapım işleri yer almaktadır.		
14) Uygulama Sonuçları	Üniversitemiz yerleşkesinde bulunan ana yolların asfaltla kaplanması işi bitirilmiştir. ( Kampüs içi yol yapım işi 5 km )		

### Kampüs İçi Ana Yolların Asfaltla Kaplama İşi

Yol Uzunluğu (Km)	Sözleşme İmzalama Tarihi (gg/aa/yy)	Bitiş Tarihi	Sözleşme Bedeli ve İş Artışı (TL.) (KDV hariç)	Fiyat Farkı	Harcama-Nominal (TL.)			
					2014	2015	2016	Toplam Harcama
5 Km	25.05.2016	10.08.2016	1.681.515,48	0,00	0,00	0,00	1.984.188,28	1.984.188,28



## 2.2 Tamamlanan Projeler

### 2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi:

**2016H031180 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi**

**2016H031190 Muhtelif İşler**

**2016H031200 Yayın Alımı**

### 2.2.2 Proje Tamamlama Raporu

#### PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
<b>Proje No</b>	2016H031190					
<b>Proje Adı</b>	Muhtelif İşler					
<b>Sektör/Altsektör</b>	Eğitim- Yüksek Öğretim					
<b>Proje Amacı</b>	Üniversitemiz hizmetlerinde kaliteyi arttırmak					
<b>Proje Yeri</b>	Ağrı					
<b>Karakteristiği</b>	B.On-Tad, Mak.Teç, Bil Don.					
<b>Fiziki Hedefi</b>	%100					
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	2016-2016					
<b>Proje Sözleşmesi Tarihi</b>			<b>Sözleşme İhale Bedeli</b>			
<b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		4.000.000			4.110.000	
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)</b>						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2016 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl(2016)</i>		4.088.000			4.088.000	
<b>Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>						
<b>Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar</b>	Üniversitemizce sunulan hizmetlerin kalitesini artırarak paydaşlarımıza kaliteli hizmet sunumu					



**PROJE TAMAMLAMA RAPORU**

<b>Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)</b>						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
<b>Proje No</b>	2016H031180					
<b>Proje Adı</b>	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi					
<b>Sektör/Altsektör</b>	Eğitim- Yüksek Öğretim					
<b>Proje Amacı</b>	Eğitim-öğretim kalitesini artırmak					
<b>Proje Yeri</b>	Ağrı					
<b>Karakteristiği</b>	Etüd-Proje.					
<b>Fiziki Hedefi</b>	%100					
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	2016-2016					
<b>Proje Sözleşmesi Tarihi</b>			<b>Sözleşme İhale Bedeli</b>			
<b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		500.000			77.290	
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)</b>						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2016 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl(2016)</i>		77.290			77.290	
<b>Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>						
<b>Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar</b>						

**PROJE TAMAMLAMA RAPORU**

<b>Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)</b>						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
<b>31. Proje No</b>	2016H031200					
<b>Proje Adı</b>	Yayın Alımı					
<b>Sektör/Altsektör</b>	<i>Eğitim- Yüksek Öğretim</i>					
<b>Proje Amacı</b>	<i>Üniversitemiz Yayın sayısının nitelik ve nicelik olarak artırılması</i>					
<b>Proje Yeri</b>	<i>Ağrı</i>					
<b>Karakteristiği</b>	<i>Kitap-Dergi</i>					
<b>Fiziki Hedefi</b>	<i>%100</i>					
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	<i>2016-2016</i>					
<b>Proje Sözleşmesi Tarihi</b>				<b>Sözleşme İhale Bedeli</b>		
<b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		110.000			72.912	
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)</b>						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2016 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl(2016)</i>		72.912			72.912	
4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yayın alımlarının diğer mal ve hizmet alımlarıyla birlikte değerlendirilmesi sonucu, yurtdışından yayın alımlarının zorlaşması ve zaman kaybı söz konusu olmaktadır. Hızla değişen, gelişen bilimsel verilere ulaşmak zaman almakta bu da eğitim-öğretimi sekteye uğratmaktadır.						
<b>Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar</b>	<i>Üniversitemizin mevcut yayın sayısında nitelik ve nicelik olarak artış sağlanmış olup eğitim-öğretim faaliyetinin daha kaliteli sunulması sağlanmıştır.</i>					

### 3. Sorunlar ve Çözümüne Yönelik Öneriler:

- ✓ İhale Mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi
- ✓ Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması,
- ✓ Üniversitemizin ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda eğitimli, teknik ve idari personel için kadro tahsisi yapılması
- ✓ Yatırım ödeneklerinin Ayrıntılı Finansman Programında inşaat mevsiminin göz önüne alınarak Maliye Bakanlığınca onaylanması,

**EKLER**

**EK-2**

**2016 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (\*)**

**Kurum Adı:** Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  
**Bütçe Türü:** Özel Bütçe

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2015 Sonu Kümülatif Harcama			2016 Yılı Program Ödenek			2016 Yılı Revize Ödenek			2016 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	7		160.610			119.105			24.110			36.607			32.792
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
<b>TOPLAM</b>	<b>7</b>		<b>160.610</b>			<b>119.105</b>			<b>24.110</b>			<b>36.607</b>			<b>32.792</b>

(\*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.

**2016 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.)**

**Kuruluş Adı :** AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

**Sektör Adı :** Eğitim

**2016 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi**

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam(9)	2015 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
254850	412,	2009H030150	Kampüs Altyapısı (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Ağrı	0,	20.000,	15.160,	0,	0,	<del>2.500</del> 2.298	(-)	202			2.298
254847	412,	2009H030160	Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Ağrı	0,	96.000,	80.896,	0,	0,	<del>10.000</del> 17.529	(+)	7.529			17.519
267516	412,	2009H030170	Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Ağrı	0,	30.000,	17.235,	0,	0,	4.000,					217
254853	412,	2010H050040	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Ağrı	0,	10.000,	5.814,	0,	0,	<del>3.000</del> 8.520	(+)	5.520			8.520
244858	412,	2016H031180	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2016	Ağrı	0,	500,	0,	0,	0,	<del>500</del> 77	(-)	423			77
244861	412,	2016H031190	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2016	Ağrı	0,	4.000,	0,	0,	0,	<del>4.000</del> 4.110	(+)	110			4.088
244864	412,	2016H031200	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2016	Ağrı	0,	110,	0,	0,	0,	<del>110</del> 73	(-)	37			73
<b>TOPLAM</b>							<b>0,</b>	<b>160.610,</b>	<b>119.105,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>36.607,</b>					
